

REGISTRO DE MODIFICACIONES.

REGISTRO DE MODIFICACIONES:			
Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
	Nombre	Firma	
Preparó:	M. Rinaldi		
Revisó:	M. Biancucci / D. Gomez		
Aprobó:	I. Eberle		
Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada			

	<u>Título:</u> Señalización Vial	Código: PO_OL_EIR Revisión: 0 Fecha de emisión: 28/12/18
---	---	--

1. OBJETO

Establecer la señalización transitoria, las condiciones de utilización y las especificaciones mínimas para los dispositivos de señalización con el objeto de prevenir accidentes viales y riesgos en los trabajos comprendidos de limpieza y retiro de cañerías.

2. ALCANCE

Es de aplicación a la Obra de Servicio de limpieza y Retiro de cañerías fuera de la zona de banquina altura de la ruta nacional N° 3 km 701, Provincia de Buenos Aires.

Alcanza a personal de Oldelval S.A y Contratistas (Servicios HLB S.A).

3. DEFINICIONES

No aplica.

4. RESPONSABILIDADES:

Específicas: Las personas o grupos de personas que tienen responsabilidades específicas en el cumplimiento de este procedimiento son:

Jefes y Líderes. Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

Supervisores/Inspectores. Serán los responsables de que el personal a su cargo, cumpla con la presente norma.

Operarios. Tienen como responsabilidad cumplir con este procedimiento.

5. DESARROLLO:

Zona de tareas.

A continuación se describen la zona de trabajos. Se deja establecido que no se trabajara en la zona de banquina y que el ingreso/egreso de camiones se efectuará sobre la zona de tareas indicada en la imagen satelital que sigue a continuación; es decir sin intervenir en la Banquina y Ruta Nacional N° 3.

Las cañerías a retirar se cargarán directamente al transporte y se trasladaran al predio del Complejo TGS.



5.4 Señalización.

Croquis de señalización conforme a la Norma IRAM 3963.


Señalización de obra fuera de banquina.

Teniendo en cuenta la zona de obra se tomará como referencia la figura A1.

Adicionalmente se colocará señalización preventiva a 500 metros en ambos sentidos de circulación, según figura siguiente:



Todo el personal que realice tareas en el sitio contara con ropa de alta visibilidad.

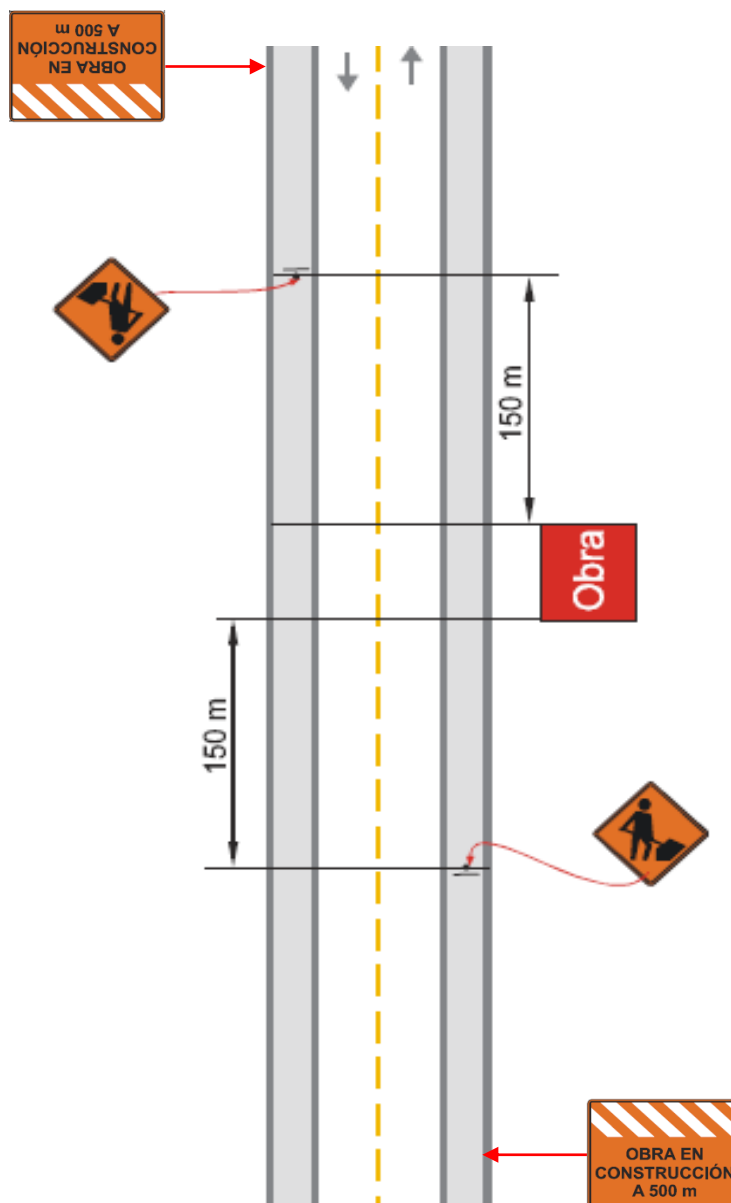

5.7 Horarios de trabajo y tiempo estimado de la Obra.

Los trabajos se efectuarán desde las 07:30 am hasta las 15.00 hs.

Se estima que el tiempo para efectuar la limpieza y retiro de la cañerías será de una semana dependiendo de las condiciones climatológicas entre otras.

Tareas previstas: semana del 14 al 18 de enero de 2019.

6. REFERENCIAS

Norma IRAM 3963. Primera edición 07-08-2009. Prevención de accidentes viales. Señalización transitoria para Obras en la vía publica. Rutas y camiones.
